
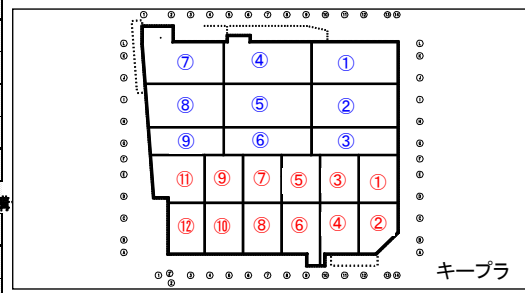


12月度月間工程表

種目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考				
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水					
仮設工事					TC3号機 TC A-BOLTフェック	ベ-スモル設置	TC電源整備	構台緩衝部解体・整備				TC3号機(JCC400H)搬入							TC3号機落成検査																		
外周部	北面				梁型枠建込み	梁CON	養生	型枠解体埋戻																													
	西面				防火水槽40tx2ヶ所	2次掘削	矢板	床付 砕石	転圧	捨CON	養生	防火水槽16P設置	防水	養生																							
	南面				1次掘削	矢板	切梁設置																														
	東面																																				
低層部	1工区				鉄骨建方準備																																
	2工区				鉄骨建方準備																																
	3工区				B1F立上り・1FスラブCON	墨出	アンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																													
	4工区				鉄骨建方準備																																
	5工区				1Fスラブ配筋 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	アンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																												
	6工区				1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	アンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																											
	7工区				鉄骨建方準備																																
	8工区				1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	アンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																												
	9工区				1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	アンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																											
	10工区				2重スラブ(型枠) 打設																																
	高層部	1工区				1F2重スラブCON	墨出	梁側型枠1F打設	1Fスラブ配筋 補強 差筋	CON止	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	F通りアンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																							
		2工区				1F2重スラブCON	墨出	梁側型枠1F打設	1Fスラブ配筋 補強 差筋	CON止	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	F通りアンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																							
3工区					1F2重スラブCON	墨出	梁側型枠1F打設	1Fスラブ配筋 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	F通りアンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																									
4工区					1F2重スラブCON	墨出	梁側型枠1F打設	1Fスラブ配筋 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出																											
5工区					1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	F通りアンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																											
6工区					1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	TC2号機1-BOLTセット																												
7工区					1F梁型枠建込み	1F打設	1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋																													
8工区					1F梁型枠建込み	1F打設	1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋																													
9工区					B1F支保工足場架設	1F梁型枠建込み	1F打設	1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋																												
10工区					B1F支保工足場架設	1F梁型枠建込み	1F打設	1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋																												
11工区					B1F柱 壁型枠	B1F支保工足場架設	1F梁型枠建込み	1F打設	1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	F通りアンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																							
12工区					B1F柱 壁型枠	B1F支保工足場架設	1F梁型枠建込み	1F打設	1F梁配筋 圧接 落込み	1Fスラブ配筋 配線 配管 補強 差筋	B1F立上り・1FスラブCON	墨出	F通りアンカーボルトフェック	ベ-スモル設置																							

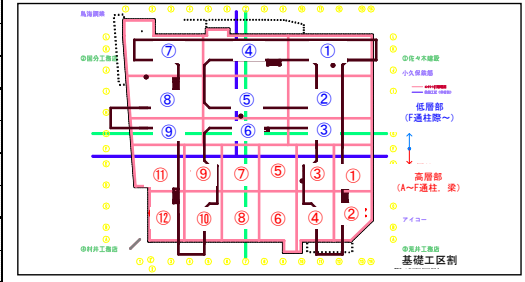

◇ 検査 ▲監理者検査(高①~④配筋検査) ▲監理者検査(低⑨配筋検査) ▲監理者検査(高⑥配筋検査) ▲監理者検査(高⑦配筋検査) ▲監理者検査(高⑩⑪配筋検査)
▲監理者検査 ▲△V検査 ▲監理者検査(北側基礎配筋検査) ▲監理者検査(低⑥配筋検査) ▲監理者検査(高①②配筋検査) ▲監理者検査(高⑧配筋検査)
▲監理者検査(低⑤⑧配筋検査) ▲監理者検査(高③④⑤配筋検査) ▲監理者検査(高⑨⑪配筋検査)
