


5 月 度 月 間 工 程 表

種 目	2009年5月																															備 考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
仮設工事	事務所引越(2) 仮設事務所②解体 仮設電気・通信撤去 仮設事務所1階解体 給排水工事 自販機 他撤去 移動 6/12・13予定(調整中)駅前仮囲い撤設																															
低層部	外部足場	4号機07A230*ストライミング																														
	鉄骨階段 他	3節鉄骨建方準備 3節鉄骨建方 395P/30P=14日 歪み直し一本締め→デッド敷き→SRC梁先行配筋 外部足場架設 5F立上り 配筋 型枠工事																														
	1工区	3節鉄骨建方準備 3節鉄骨建方 歪み直し一本締め→デッド敷き→SRC梁先行配筋 外部足場架設 5F立上り 配筋 型枠工事																														
	2工区	②4F立上り5Fス7' CON 歪み直し一本締め→デッド敷き→SRC梁先行配筋 外部足場架設 5F立上り 配筋 型枠工事																														
	3工区	小梁側型枠建込 ス7'型枠(ゲツ) 5Fス7'配筋 歪み直し一本締め→デッド敷き→SRC梁先行配筋																														
高層部	4工区	5F小梁配筋→圧接→STPまとめ 大梁型枠返し 5Fス7'配筋 歪み直し一本締め→デッド敷き→SRC梁先行配筋																														
	3F	3F ①②梁底型枠解体 撤出 3F ③④梁底型枠解体 撤出 3F支保工解体 撤出																														
	2F	2F支保工解体 撤出 (K~L間37廻り) 区画ALC工事 設備配管・区画処理																														
	1F	1F支保工解体 撤出 階段9開口部足場解体 松村組 大木組 階段9建方18P 5F側解体 開口部足場解体 PC階段7(1F~3F) PC階段7(3F~5F) PC階段8(4F~5F)																														
	外部足場	⑤6F外部(開口)足場架設 ①7F外部(開口)足場架設 ②7F外部(開口)足場架設 ③7F外部(開口)足場架設 ④7F外部(開口)足場架設 ⑤7F外部(開口)足場架設 ①8F外部(開口)足場架設																														
	鉄骨階段 他	階段5 階段6 階段4 階段5 BCG検査 階段6																														
	1工区	7F梁配筋 7F在来ス7'型枠 7F梁側型枠 ①7F梁・ス7' CON 7F支保工足場架設 7F柱PC 7F柱・8F梁底型枠8F梁配筋 8F在来ス7'型枠 8F梁側型枠 8F床PC 8Fス7'配筋 ①8F梁・ス7' CON																														
	2工区	6F柱・7F梁配筋 7F在来ス7'型枠 7F梁側型枠 7F床PC 7Fス7'配筋 ②7F梁・ス7' CON 7F支保工足場架設 7F柱PC 7F柱・8F梁底型枠8F梁配筋 8F在来ス7'型枠 8F梁側型枠 8F床PC 8Fス7'配筋 6/1CON打設 CON止																														
	3工区	6F柱PC 6F柱・7F梁底型枠 7F梁配筋 7F在来ス7'型枠 7F梁側型枠 ③7F梁・ス7' CON 7F支保工足場架設 7F柱PC 7F柱・8F梁底型枠 8F梁配筋 8F在来ス7'型枠 8F床PC																														
	4工区	6F支保工足場架設 撤出・外部足場架設 6F柱PC 6F柱・7F梁底型枠7F梁配筋 7F在来ス7'型枠 7F梁側型枠 7F床PC 7Fス7'配筋 ④7F梁・ス7' CON 7F支保工足場架設 7F柱PC 7F柱・8F梁底型枠8F梁配筋																														
	5工区	⑤6F梁・ス7' CON 6F支保工足場架設 撤出・外部足場架設 6F柱PC 6F柱・7F梁底型枠7F梁配筋 7F在来ス7'型枠 7F梁側型枠 7F床PC 7Fス7'配筋 ⑤7F梁・ス7' CON 7F支保工足場架設 7F柱PC 7F柱・8F梁底型枠																														
	4F	⑤梁底型枠解体 撤出 ⑥梁底型枠解体 撤出 4F支保工 解体 7Fへ転用 4F支保工 解体 7Fへ転用 転用後残片付け 撤出																														
	3F	3F支保工 6Fへ転用 転用後残片付け 撤出 階段・シャフト足場整備 (E~G間37廻り) 区画ALC工事																														
	2F	2F支保工 5Fへ転用完了 転用後残片付け 撤出 階段・シャフト足場整備 (E~G間37廻り) 区画ALC工事 先行ランナー取付け																														
	1F	支保工撤出完了 IC1号機 穴駆体工事(1F) CON 階段・シャフト足場整備 (E~G間37廻り) 区画ALC工事 先行ランナー取付け																														
B1F	天井ス7'下断熱材吹付 特高受変電室・サブ変電室 天井ス7'下断熱吹付工事 設備配管 外 ラック取付け工事 壁GW工事																															
B2F	設備工事 区画壁 2重壁LGS ネット貼り 設備配管 外 ラック取付け工事 先行 塗床工事 設備機器搬入																															
ピット	冷水蓄熱槽 床断熱シート防水 床断熱シート防水																															
湧水槽	設備配管立上 冷却塔用受水槽・中水受水槽・雨水貯留槽・汚水槽 塗膜防水																															
その他 (塗膜防水部)	1F 2重ス7'内塗膜防水工事																															
◇ 検 査	▲監理者検査(高⑤配筋検査) ▲監理者検査(低③高①配筋検査) ▲監理者検査(高④配筋検査) ▲監理者検査(高⑤配筋検査) ▲監理者検査(高①配筋検査)																															
▲監理者検査 △JV検査	▲監理者検査(低④高②配筋検査) ▲監理者検査(高③配筋検査) ▲鉄骨3節製品検査 ▲監理者検査(高③配筋検査)																															

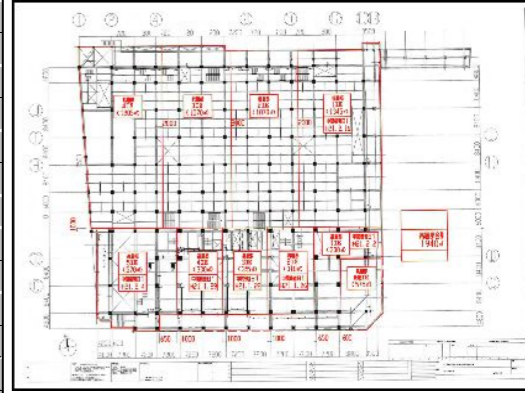

地上躯体工事キープラン
