八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事	2009 年 3 月 27 日 作成	八王子駅南口地区再開発組合	監　理	八王子駅南口再開発JV工事事務所	作成者

４　月　度　月　間　工　程　表

種　目		1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	備　考
仮設工事																	TC1号機ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ（1回目）					1F既設詰所				仮設詰所①解体			電気　備品　通信整備			5/1･2引越	
																	B1F新詰所		B1F仮設詰所　仮設ﾄｲﾚ　新設工事				詰所引越①		仮設事務所増設工				B1F仮設詰所新設工事		
低層部	外部足場	E-F間5G鉄骨		②4F外部(開口)足場架設														③4F外部(開口)足場架設			④4F外部(開口)足場架設											
	鉄骨階段　他			5Gﾊｲｽﾃｰｼﾞ 解体														5Gﾊｲｽﾃｰｼﾞ 解体			5Gﾊｲｽﾃｰｼﾞ 解体											
	1工区	4F柱型枠建込		4F支保工足場架設			5F大梁型枠　小梁底型枠建込				5F小梁配筋→圧接→STPまとめ				→小梁側型枠　5Fｽﾗﾌﾞ型枠(ﾃﾞｯｷ)			5Fｽﾗﾌﾞ配筋　立上り配筋			CON止	①4F立上り5Fｽﾗﾌﾞ'CON			内外部足場架設	支保工足場架設	3節鉄骨建方準備					
											大梁型枠返し											墨出	墨出										
	2工区	4Fｽﾗﾌﾞ配	②3F立上り4Fｽﾗﾌﾞ'CON		4F柱配筋	4F柱型枠建込み			4F支保工足場架設		5F大梁型枠　小梁底型枠建込				5F小梁配筋→圧接→STPまとめ									5Fｽﾗﾌﾞ配筋　立上り配筋			②4F立上り5Fｽﾗﾌﾞ'CON			内外部足場架設　支保工足場架設				
			墨出												大梁型枠返し						PC階段8(3F～4F)											
	3工区		3F支保工足場架設	4F大梁型枠　小梁底型枠建込				小梁配筋→圧接→STPまとめ		小梁側型枠建込			ｽﾗﾌﾞ型枠(ﾃﾞｯｷ)	4Fｽﾗﾌﾞ配筋			③3F立上り4Fｽﾗﾌﾞ'CON		4F柱型枠建込み			4F支保工足場架設		5F大梁型枠　小梁底型枠建込				5F小梁配筋→圧接→STPまとめ				
								大梁型枠返し									墨出	墨出	4F柱配筋										大梁型枠返し				
	4工区		3F支保工足場架設	4F大梁型枠　小梁底型枠建込				小梁配筋→圧接→STPまとめ		小梁側型枠建込			ｽﾗﾌﾞ型枠(ﾃﾞｯｷ)			4Fｽﾗﾌﾞ配筋		④3F立上り4Fｽﾗﾌﾞ'CON			4F柱型枠建込み				4F支保工足場架設		5F大梁型枠　小梁底型枠建込					
								大梁型枠返し										墨出			墨出	4F柱配筋											
	3F						柱型枠解体　転用												柱型枠解体　転用														
	2F				②梁底型枠解体　搬出				①②支保工　解体　転用										③梁底型枠解体　搬出		④梁底型枠解体　搬出			③④支保工　解体　転用								
	1F		②③④支保工　解体　転用		E-F間		鉄骨階段11(1F～3F)8P							階段9	8～13通り5G本締め		開口足場解体		鉄骨階段9(1F～5F)		1～8通り5G本締め	松村組	大木組	鉄骨階段25(4F～5F)		調整						
											高層③CON打設後　7日目						松村組	大木組			調整											
高層部	外部足場					①5F外部(開口)足場架設		②5F外部(開口)足場架設		③5F外部(開口)足場架設		④5F外部(開口)足場架設			⑤5F外部(開口)足場架設								①6F外部(開口)足		②6F外部(開口)足場架設			③6F外部(開口)足場架設					
	鉄骨階段　他			鉄骨階段6								鉄骨階段4							鉄骨階段5					鉄骨階段6						鉄骨階段4		
	1工区	5Fｽﾗﾌﾞ配筋		①5F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON			5F支保工足場架設			5F柱PC	5F柱・6F梁底型枠		6F梁配筋			6F在来ｽﾗﾌﾞ型枠		6F床PC	6Fｽﾗﾌﾞ配筋				①6F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON		6F支保工足場架設			6F柱PC	6F柱・7F梁底型枠		7F梁配筋	
		段差枠　CON止		墨出・外部足場架設											6F梁側型枠						段差枠　CON止		墨出・外部足場架設								
	2工区	ｽﾗﾌﾞ型枠	5F床PC	5Fｽﾗﾌﾞ配筋		②5F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON		5F支保工足場架設		5F柱PC		5F柱・6F梁底型枠	6F梁配筋			6F在来ｽﾗﾌﾞ型枠		6F床PC	6Fｽﾗﾌﾞ配筋		②6F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON		6F支保工足場架設			6F柱PC	6F柱・7F梁底型枠			
		梁側型枠		段差枠　CON止		墨出・外部足場架設										6F梁側型枠					段差枠　CON止		墨出・外部足場架設								
	3工区	6F梁配筋	5F在来ｽﾗﾌﾞ型枠	5F床PC		5Fｽﾗﾌﾞ配筋	③5F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON		5F支保工足場架設					5F柱PC	5F柱・6F梁底型枠	6F梁配筋				6F在来ｽﾗﾌﾞ型枠	6F床PC	6Fｽﾗﾌﾞ配筋	③6F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON		6F支保工足場架設							
			5F梁側型枠			段差枠　CON止		墨出・外部足場架設													6F梁側型枠		段差枠　CON止		墨出・外部足場架設							
	4工区	梁底型枠	6F梁配筋	5F在来ｽﾗﾌﾞ型枠		5F床PC	5Fｽﾗﾌﾞ配筋	④5F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON		5F支保工足場架設		TC1号機ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ(1回目)	5F柱PC		5F柱・6F梁底型枠	6F梁配筋				6F在来ｽﾗﾌﾞ型枠	6F床PC	6Fｽﾗﾌﾞ配筋		④6F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON								
				5F梁側型枠			段差枠　CON止	墨出・外部足場架設													6F梁側型枠		段差枠　CON止									
	5工区	4F柱PC	4F柱・5F梁底型枠	5F梁配筋			5F在来ｽﾗﾌﾞ型枠	5F床PC	5Fｽﾗﾌﾞ配筋		⑤5F梁･ｽﾗﾌﾞ'CON				墨出・外部足場架設				5F支保工足場架設		5F柱PC	5F柱・6F梁底型枠	6F梁配筋				6F在来ｽﾗﾌﾞ型枠	6F床PC	6Fｽﾗﾌﾞ配筋			
							5F梁側型枠		段差枠　CON止																		6F梁側型枠					
	4F				養生		側型枠解体　転用　搬出								側型枠解体　転用　搬出							①梁底型枠解体	搬出	4F①支保工　解体　転用準備									
	3F				①梁底型枠解体　搬出		3F①支保工　解体　転用準備								⑤梁底型枠解体　搬出			3F⑤支保工　解体　転用準備															
	2F	2F支保工解体完了																														
	1F	1F支保工解体完了																														
				テルハ仮設開口CON																			B1F住宅駐輪場　ﾊﾞｲｸ置場嵩上げCON					B1F住宅用ｺﾞﾐ集積所嵩上げCON						
B1F	駐車場	SS下地取付(ﾄﾗｽﾄｳｫｰﾙ)		SS下地LGS　区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼り(ｻﾝｾｰ)					4/6～天井断熱材吹付(H～L通り)(ｴｽｹｰ化研)												4/20～天井断熱材吹付(E～H通り)(ｴｽｹｰ化研)										
	発電機室			ALC先行ﾋﾞｰｽ取付(ISE)			ﾏｼﾝﾊｯﾁ下部足場	仮設屋根		4/9～11駐車場ALC(ISE)				屋内ﾀﾝｸ室ALC取付																		
	給排気ﾌｧﾝﾙｰﾑ		B1F～1F煙突取付(太平産業)													ALC取付	4/15～ﾀﾜｰﾊﾟｷﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ打継部塗膜防水							天井　壁GW貼り						
	ｻﾌﾞ変電室										区画壁　2重壁先行ﾗﾝﾅｰ			天井断熱材吹付(ｴｽｹｰ化研)							区画壁LGS～ﾎﾞｰﾄﾞ貼り						壁GW貼り＊2重壁以外(関東ﾛｯｸｳｰﾙ)				
	特高受変電室　MDF																						天井断熱材吹付(ｴｽｹｰ化研)									
	EPS4　ｺｱ部		EPS4(高層部B1F～2F)　水抜き　耐火ﾓﾙﾀﾙ工事														EPS4　ALC取付						B1Fｺｱ部ALC取付									
B2F	駐車場	B1F　B2F防煙垂壁工事(ﾋﾞｽ)		SS下地取付(ﾄﾗｽﾄｳｫｰﾙ)				SS下地LGS　区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼り(ｻﾝｾｰ)																						
	熱源機械室　ほか	外壁導水用ｼｰﾄ防水								天井　壁　床左官補修					設備工事																
	ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ室　ほか										天井　壁補修			床左官補修							設備工事										
	給排気ﾌｧﾝﾙｰﾑ													2重壁LGS～ﾎﾞｰﾄﾞ貼り					天井　壁GW　床左官補修				設備工事								
	ｺｱ部																		ALC取付												
ピット	冷水蓄熱槽		冷水蓄熱槽　壁断熱防水					冷水蓄熱槽　床断熱防水							冷水蓄熱槽　床断熱防水							冷水蓄熱槽　床断熱防水										
	ほか		雨水貯留槽　冷却用受水槽　中水受水槽　塗布防水											雨水貯留槽　冷却用受水槽　中水受水槽　塗布防水											雑排水槽　汚水槽　流量調整槽　ほか(C種)塗膜防水						

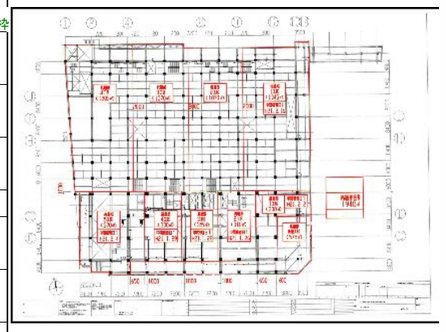

地上躯体工事キープラン

◇　検　査　▲監理者検査(高①配筋検査)　▲監理者検査(高④配筋検査)　▲監理者検査(低③配筋検査)　▲監理者検査(低①高①配筋検査)　▲監理者検査(低②配筋検査)　▲監理者検査(高④配筋検査)

▲監理者検査　△JV検査　▲監理者検査(高②配筋検査)　▲監理者検査(高⑤配筋検査)　▲監理者検査(低④配筋検査)　▲監理者検査(高②B1F配筋検査)

▲監理者検査(高③配筋検査)　▲監理者検査(高③配筋検査)
