
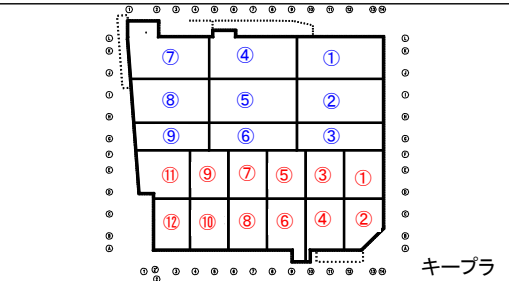


# 10月度月間工程表

種目	10月																															備考									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金										
仮設工事						TC1号機 TC A-BOLTチェック ベースバル設置 TC電源配線 整備					高層⑧22.05N確認 TC1号機搬入					TC1号機落成検査 TC1号機使用開始																									
外周部	仮設電気工事(各階分電盤設置 支保工架設後照明設置 コック-整備)					仮設電気工事(各階分電盤設置 支保工架設後照明設置 コック-整備)																																			
低層部	北面	クレーン・クレーン・クレーン				掘削 捨CON 墨出 基礎配筋					止栓 CON 墨出 型枠 CON					脱型 埋戻																									
	西面																																								
	南面																																								
	東面																																								
	1工区	②B1Fスラブ CON待ち														工区境 B1F 柱筋 壁筋配筋 B1F柱型枠 壁型枠建込み					B1F支保工足場架設																				
	2工区	③B1Fスラブ施工待ち				3工区境 B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口					B2F立上り・B1Fスラブ CON 1段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 床カッター 構台下部解体					B1F 柱筋 壁筋配筋~H通りまで B1F柱型枠 壁型枠建込み					B1F支保工足場架設																				
	3工区	H-F間 支保工足場架設 B1F 梁型枠				B1Fスラブ 敷き H-F間 2重スラブ CON 墨出 梁型枠 ティ敷					高層部①③⑤B1Fスラブ 敷き施工待ち					高層部工区境 B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差					B2F立上り・B1Fスラブ CON 1段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 床カッター 構台下部解体																				
	F-E間																																								
	4工区	スラブ 腹起解体 擁壁 SMW天端はつり 墨出				外壁外防水 B1F柱 壁配筋 耐圧スラブ 配筋 ループコイル 差筋 補強スラブ 2斜路 CON 目地カッター スラブ 部支保工足場架設 墨出 5B1Fスラブ CON待ち					外壁外防水 墨出 アンクル取付 工区境 B1F 柱筋 壁筋配筋					B1F柱型枠 壁型枠建込み																									
	5工区	⑥B1Fスラブ施工待ち				B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口					6工区境 B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋					残スラブ CON 墨出 型枠建込み					B2F立上り・B1Fスラブ CON 墨出 床カッター 構台下部解体					B1F 柱筋 壁筋配筋~H通りまで B1F柱型枠 壁型枠建込み															
	6工区	H-F間B2F柱 壁型枠建込み H-F間 支保工足場架設				B1F 梁型枠 B1Fスラブ 敷き H-F間					高層部⑤⑦⑨B1Fスラブ 敷き施工待ち										高層部工区境 B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋																				
	F-E間																																								
7工区	B1F 柱配筋 壁配筋																																								
8工区	B1F残CON																																								
9工区	⑨B1Fスラブ施工待ち																																								
F-E間																																									
高層部	1工区	B2F 柱 壁配筋				B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き					B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋					B2F立上り・B1Fスラブ CON 1段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 床カッター 構台下部解体															
	2工区	B2F 柱 壁配筋				B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き					B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋					B2F立上り・B1Fスラブ CON 1段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 床カッター 構台下部解体															
	3工区	B2F柱筋 壁配筋				B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き					B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋					B2F立上り・B1Fスラブ CON 墨出 床カッター															
	4工区	2段目7-スランカー・腹起撤去 床カッター 構台下部解体 墨出 止水				B2F 柱 壁配筋 B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き					B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋					B2F立上り・B1Fスラブ CON 墨出 床カッター															
	5工区	基礎梁・B2スラブ CON 墨出 床カッター				B2F 柱 壁配筋					B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き					B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋															
	6工区	基礎梁・B2スラブ CON 墨出 床カッター				2段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 止水					B2F 柱 壁配筋 B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き					B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋															
	7工区	9/27~基礎梁上部 B2スラブ 基礎梁・B2スラブ CON 墨出 床カッター				B2F 柱 壁配筋					B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き					B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋															
	8工区	9/29~基礎梁上部 B2スラブ 配筋 段差枠 CON止				基礎梁・B2スラブ CON 墨出 床カッター					2段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 止水					B2F 柱 壁配筋 B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き					B1F 梁配筋 B1スラブ 配筋 開口 差筋										
	9工区	基礎梁上部 B2スラブ 配筋 段差枠 CON止				基礎梁・B2スラブ CON 墨出 床カッター					構台下部解体 B2F 柱 壁配筋					B2F 柱 壁型枠 B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き																				
	10工区	基礎梁上部 B2スラブ 配筋 段差枠 CON止				基礎梁・B2スラブ CON 墨出 床カッター					2段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 止水					B2F 柱 壁配筋					B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設					B1F梁型枠 B1Fスラブ 敷き										
	11工区	2重スラブ CON 墨出 側 スラブ型枠→梁 スラブ 配筋				基礎梁上部 B2スラブ 配筋 差筋 段差枠 CON止					基礎梁・B2スラブ CON 墨出 床カッター					2段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 止水					B2F 柱 壁配筋					B2F 柱 壁型枠					B2F支保工足場架設										
	12工区					基礎梁上部 B2スラブ 配筋 差筋 段差枠 CON止					基礎梁・B2スラブ CON 墨出 床カッター					2段目7-スランカー・腹起撤去 墨出 止水					B2F 柱 壁配筋					B2F 柱 壁型枠															

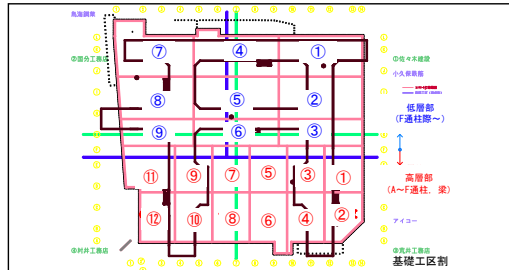

◇ 検査 ▲監理者検査(高⑥配筋検査) ▲監理者検査(高⑦配筋検査) ▲監理者検査(高⑨配筋検査) ▲監理者検査(高⑩配筋検査) ▲監理者検査(低⑤配筋検査) ▲監理者検査(高①配筋検査) ▲監理者検査(高③配筋検査) ▲監理者検査(高②配筋検査) ▲監理者検査(高④配筋検査) ▲監理者検査(高⑧配筋検査) ▲監理者検査(高⑩配筋検査) ▲監理者検査(低②高⑩配筋検査) ▲監理者検査(低⑧配筋検査) ▲監理者検査(低③高②配筋検査) ▲監理者検査(高④配筋検査)
